

# → RD 1029

Renforcement de la couche de roulement.

LAMOTTE-WARFUSEE (80)



YEAR OF DELIVERY → 2016

## → MISSION / DESCRIPTION

- Section 1: entre LAMOTTE-WARFUSEE et la RD41.
- Section 2: entre FOUCAUCOURT et ESTREES-DENIECOURT.

## → SPECIFICITIES OF THE OPERATION

- Rabotage de 0 à 15cm: 60 000 m<sup>2</sup>.
- Enrobés tièdes 0/10 recyclés 10%: 9 000T.
- Réglage accotements: 32 000 m<sup>2</sup>.
- Réparation de 2 parkings.


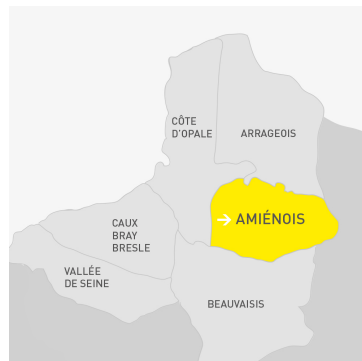
**TRAVAUX PUBLICS**

**BÂTIMENT**

DÉPOLLUTION  
DÉSAMIANTAGE  
DÉCONSTRUCTION

**DÉCHETS**

**EAU**

→ ACTIVITY AREA : Access roads

→ MARKET TYPE : Public

→ COST OF WORKS : 800 000 € HT

→ CLIENT : DEPARTEMENT DE LA SOMME DGA Equipement du Département

→ PROJECT MANAGER : Agence routière Est du Département à Péronne
